

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月04日

計画の名称	尾道市公共下水道（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	尾道市												
計画の目標	安定した公共水域の水質確保のため、老朽化した施設の診断・計画・更新、下水道ストックマネジメント計画策定を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	639	A	635	B	0	C	4	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.62	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H29末	H32末
1	更新が必要な4施設について、平成29年度末までに更新を完了させる。 平成29年度末までの施設の更新 更新済施設数/更新対象施設	0%	100%	100%
2	平成32年度までに下水道ストックマネジメント計画を策定する。 下水道ストックマネジメント計画策定達成率 策定済み下水道ストックマネジメント計画/策定すべき下水道ストックマネジメント計画	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	管渠(汚水)	改築	長寿命化支援事業(尾道市浄化センター)	改築・更新 最初沈殿池他(水処理能力6,000m3/日)	尾道市						518		策定済	
		長寿命化計画																		
	A07-003	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	管渠(汚水)	新設	尾道処理区点検調査	汚水幹線管渠調査点検	尾道市							5		-
	A07-004	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	-	改築	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定	尾道市							112		-
												小計						635		
											合計						635			

C 効果促進事業


基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	-	-	ストックマネジメント計 画策定	BCP策定	尾道市						4		-
下水道事業A07-004と一体的に整備することで、施設の状況を踏まえた業務継続計画の運用が可能となる。																			
											小計						4		
											合計						4		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
尾道市上下水道局の公共下水道事業に関連した内部組織において事業効果の検証及び数値目標の達成状況を検証し、今後の整備計画を検討した。	令和3年度
	公表の方法 市のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>【指標1】更新が必要な4施設について、平成29年度末までに更新を完了させる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・更新工事等が必要な対象施設4施設について計画どおり実施した。 ・尾道市浄化センターの施設の更新工事等により安定した公共水域の水質確保が実現できた。 <p>【指標2】平成32年度までに下水道ストックマネジメント計画を策定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定すべき下水道ストックマネジメント計画（施設）を計画どおり策定した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後、安定した公共水域の水質確保及び浸水対策を目的として、下水道ストックマネジメント計画により公共下水道施設の更新工事等を実行する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	更新済施設数/更新対象施設数	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	策定済み下水道ストックマネジメント計画/策定すべき下水道ストックマネジメント計画	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

社会資本総合整備計画

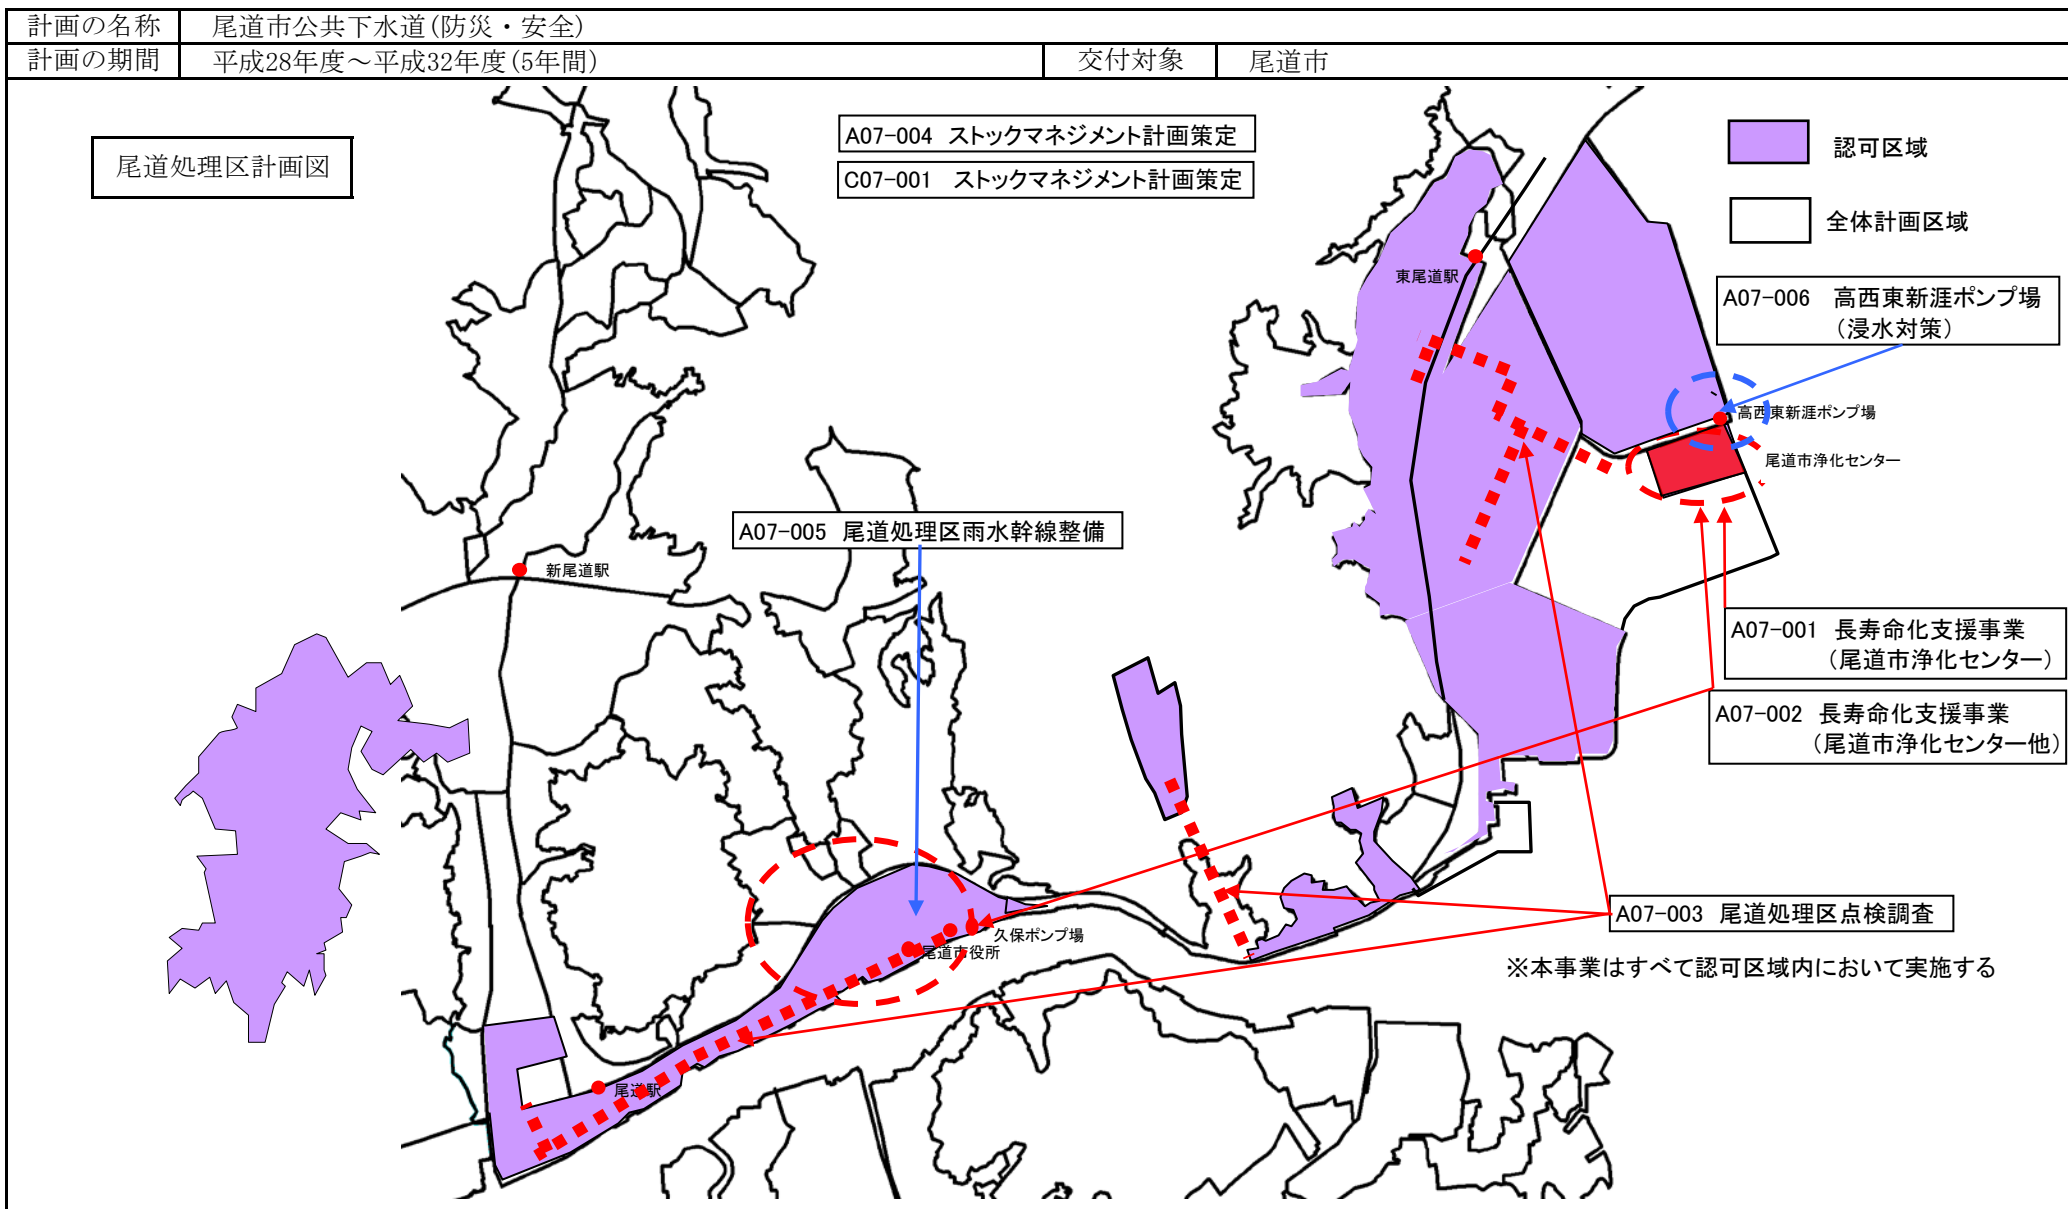

社会資本総合整備計画

計画の名称	尾道市公共下水道(防災・安全)		
計画の期間	平成28年度～平成32年度(5年間)	交付対象	尾道市

